

# ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ  
ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ  
ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ- Β ΦΑΣΗ  
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)»

MIS 5003381

ΠΑΤΡΑ 20-03-2019

# ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ



## ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

- Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : «Υποδομές Μεταφορών – Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.)

## 5 ΥΠΟΕΡΓΑ

- «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ»
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
- «ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ Α/Σ»
- «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ»
- «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ Α/Σ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΟΥ»

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- ΦΑΣΗ Α' : 39.077.166,00 €
- ΦΑΣΗ Β' : 24.034.769,73 €

**«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ»**

# ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

- Ένταξη Έργου στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 - (Αρ.Πρωτ.: 184804/30-12-2010 Ε.Υ.Δ./ΥΠ.Ε.Κ.Α.) - MIS 322631.
- Έργο (PHASING)-ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ 2014-2020 - (Αρ.Πρωτ.:15662/16-12-2016 - Ε.Γ.Δ.Τ./ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ.)- MIS 5003381.
- Κύριος του Έργου & Φορέας Λειτουργίας: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ / Δ.Ε.Υ.Α. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
- Φορέας Υλοποίησης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ) .
- Η συνεργασία των φορέων Κ.τ.Ε.-Φ.Υ. γίνεται σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 Ν.3852/2010.
- Σκοπός Πράξης : Ολοκλήρωση των Υποδομών Συλλογής & Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων στους οικισμούς Γ΄ Προτεραιότητας (Πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.) σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

# ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Παράμετρος	Μ.Μ	Α΄ Φάση (20ετία)	Β΄ Φάση (40ετία)
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ	κατ.	<b>ΜΟΝΙΜΟΣ – ΑΙΧΜΗΣ</b> 40.000-70.000	<b>ΜΟΝΙΜΟΣ – ΑΙΧΜΗΣ</b> 58.000-98.000
ΜΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /d	<b>ΜΟΝΙΜΟΣ – ΑΙΧΜΗΣ</b> 6.400-11.200	<b>ΜΟΝΙΜΟΣ – ΑΙΧΜΗΣ</b> 9.280-15.680
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΙΧΜΗΣ	l/s	<b>ΜΟΝΙΜΟΣ – ΑΙΧΜΗΣ</b> 269-420	<b>ΜΟΝΙΜΟΣ – ΑΙΧΜΗΣ</b> 361-554

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

# ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΩΝ

## ΥΠΟΕΡΓΟ 1 –

### «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ»»

- Δημοπράτηση: 23-08-2011 (Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης & μελέτη – κατασκευή Α/Σ)
- Υπογραφή σύμβασης: 30-04-2013
- Ποσό Σύμβασης: 25.435.442,03 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α.

#### ■ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης κεντρικών αποχετευτικών αγωγών μήκους 60KM, σωλήνων από PVC σειράς 41 και HDPE 10atm διαφόρων διαμέτρων και δεκατριών (13) αντλιοστασίων στους παραλιακούς οικισμούς από πρώην Δήμο Ερινεού έως πρώην Δήμο Αιγείρας και συγκεκριμένα στους οικισμούς: Ακράτας, Κραθίου, Σιλύβαινας, Διακοπτού, Τεμένης, Διγιελιώτικων, Βαλιμιτίκων, Ροδοδάφνης, Αβύθου, Λόγγου, Σελιανιτίκων, Καμαρών και Ν. Ερινεού

2. Δοκιμαστική λειτουργία για 3 μήνες

# Στοιχεία υποέργων

## ΥΠΟΕΡΓΟ 2 - «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ»

- Δημοπράτηση: 22-08-2011
- Υπογραφή σύμβασης: 25-06-2013
- Ποσό Σύμβασης: 544.082,00 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ

### Τεχνικό Αντικείμενο

**Α.** Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου από ιδιωτικό γραφείο για την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου με βάση τις διατάξεις του Ν. 3316/05.

**Β.** Υποβοήθηση του Φορέα στην διαγωνιστική διαδικασία, στην παρακολούθηση της κατασκευής και στη δοκιμαστική λειτουργία του ΔΠΝ.

**Γ.** Στα καθήκοντα του Τεχνικού Συμβούλου περιλαμβάνεται η γενική υποστήριξη στην διαχείριση των εργολαβικών συμβάσεων, όπως στον έλεγχο αιτημάτων των αναδόχων.



# ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΩΝ

## ΥΠΟΕΡΓΟ 3 - «ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ Α/Σ»

- Δαπάνη : 105.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

### Τεχνικό Αντικείμενο

Πληρωμή δαπανών σύνδεση με την Δ.Ε.Η., για την ηλεκτροδότηση του Α/Σ και των Ε.Ε.Λ. .

## ΥΠΟΕΡΓΟ 4 - «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ»

- Δαπάνη : 450.000,00 ευρώ

### Τεχνικό Αντικείμενο

Δαπάνες εργασιών αρχαιολογικής επίβλεψης σκαπτικών εργασιών

## ΥΠΟΕΡΓΟ 5 - «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΟΥ»

- Δαπάνη : 400.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

### Τεχνικό Αντικείμενο

Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση των κεντρικών αντλιοστασίων λυμάτων του Αιγίου, το οποίο αναλύεται σε : α) Έργα Π-Μ με κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού μήκους 354,0 m από HDPE 315 PN 10 ATM και β) Έργα Η-Μ με αναβάθμιση του εξοπλισμού του Α/Σ.

# ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

- **Υπόέργο 1**

**Α.** Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του αποχετευτικού δικτύου και η δοκιμαστική λειτουργία των Α/Σ – Νοέμβριος 2018.

**Β.** Το έργο έχει παραδοθεί σε λειτουργία προς τον Κύριο του Έργου/ Πράξης – Δήμος Αιγιαλείας

- **Υπόέργο 2**

Το υπόεργο ολοκληρώνεται με την ολοκλήρωση της Προσωρινής Παραλαβής

- **Υπόέργο 3**


Το υπόεργο έχει ολοκληρωθεί - Προαπαιτούμενο για τη λειτουργία του Υποέργου 1

- **Υπόέργο 4**

Το υπόεργο έχει ολοκληρωθεί - Προαπαιτούμενο για τη λειτουργία του Υποέργου 1

- **Υπόέργο 5**

Υπό δημοπράτηση / Απριλίου 2019 – Έχει δοθεί η απαραίτητη γνωμοδότηση από την Ε.Υ.Δ. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. & έχει ληφθεί η σχετική απόφαση από την Προϊσταμένη Αρχή

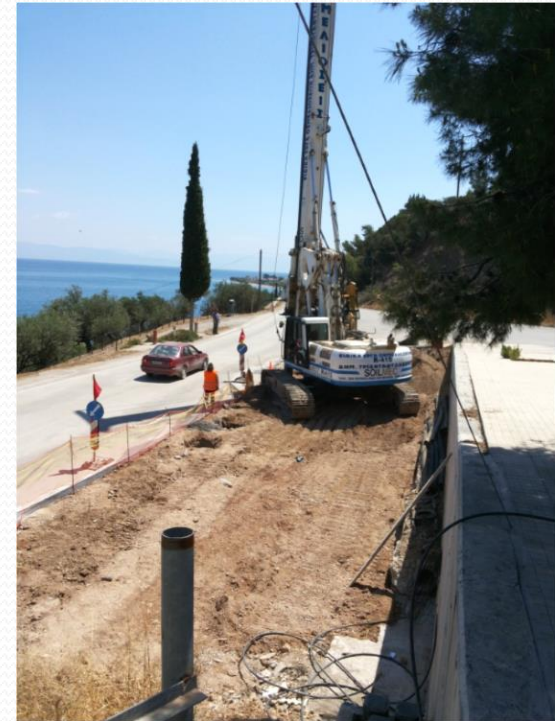



# ΣΥΝΟΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΝΤΑΞΗ ΙΔΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ

ΑΡ. ΥΠΟΕ ΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Προϋπολογισμός Ένταξης	ΣΥΜΒΑΣΗ / Τελικός Προϋπολογισμός	Πληρωμές έως 31-12-2018	Υπόλοιπο προς πληρωμή
1	«Κατασκευή Κεντρικών Αποχετευτικών Αγωγών Παραλιακών Οικισμών από Δήμο Ερινεού έως Δήμο Αιγείρας »	36.900.000,00€	31.234.497,35	30.377.925,46	856.571,89
2	«Τεχνικός Σύμβουλος»	836.400,00	669.220,86	486.742,41	182.965,40
3	«Ηλεκτροδότηση Α/Σ»	129.150,00	129.150,00	95.937,90	33.212,10
4	«Αρχαιολογία»	450.000,00	450.000,00	309.923,07	140.076,93
5	«Αναβάθμιση του Κεντρικού Α/Σ Λυμάτων Αιγίου»	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00

Ένταξη Α' Φάσης (Συνολική Δημόσια Δαπάνη ): 39.077.166,00 €

Ένταξη Β' Φάσης (Συνολική Δημόσια Δαπάνη): 24.034.769,73 €

# ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

- ❑ **ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (ΠΑΓΕΤΟΣ- ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ)**
- ❑ **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΔΕΥΣΕΩΝ / ΜΕΛΕΤΗΣ, ΛΟΓΩ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑ «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.»**
- ❑ **ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4**



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!
